SpaceEye · Light-table version (Arabic)

Local version for review · 4 screens · captured 2026-11-02

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير

زور C18، C07، C14 وC03 الدورة دي

4 من 12 كمباوند في R7 · بيانات 2026Q3

ترتيب الزيارات

1. **C18** ● زيارة فورية
   رصد نشاط بناء، تجاوز أول موعد تسليم معلن (ديسمبر 2021) بمقدار 57 شهرًا

2. **C07** ● زيارة الدورة دي
   لم يرصد نشاط بناء منذ ربعين، لا يوجد موعد تسليم معلن متاح

3. **C14** ● زيارة الدورة دي
   رصد نشاط بناء، تجاوز أول موعد تسليم معلن (ديسمبر 2024) بمقدار 21 شهرًا

4. **C03** ● مراجعة مستندات
   لم يرصد نشاط بناء منذ 6 أرباع، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني

وكمباوندين كمان في انتظار الدورة الجاية.

اللي اتغير من ربع 2026Q2

C07 دخل القائمة · المستوى كان 3 وبقى 2
لم يرصد نشاط بناء منذ ربعين، لا يوجد موعد تسليم معلن متاح

C10 طلع من القائمة · المستوى كان 1 وبقى 4
رصد نشاط بناء، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني

مواعيد تسليم جاية

C14 · وعد ببداية التسليم سنة 2026
اتنشر سبتمبر 2024

C14 · وعد بالتسليم سنة 2027
اتنشر فبراير 2026



Wayback release 2026-09-24 | Esri World Imagery Wayback; imagery: Vantor. Service credits: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
Cyan: reviewed working boundary, not a legal survey. Source dates may vary within the map.
Static educational report figure. Third-party imagery rights retained; not an open imagery dataset.

C18 صورة 2025-07-23 تحت الإنشاء

افتح ملف C18



2025-07-23 تحت الإنشاء

2022-06-13 تحت الإنشاء

2020-06-28 تحت الإنشاء

2016-12-17 أرض أو أعمال حفر

الصور من Esri World Imagery Wayback، وبيانات كل صورة مطبوعة تحتها.

Track A · screen 1 · part 1

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير

C10 طلع من القائمة · المستوى كان 1 وبقى 4

رصد نشاط بناء، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني

مواعيد تسليم جاية

C14 · وعد ببداية التسليم سنة 2026

اتنشر سبتمبر 2024


C14 · وعد بالتسليم سنة 2027

اتنشر فبراير 2026

C21 · وعد بالتسليم لحد ديسمبر 2027

اتنشر فبراير 2026

أماكنهم

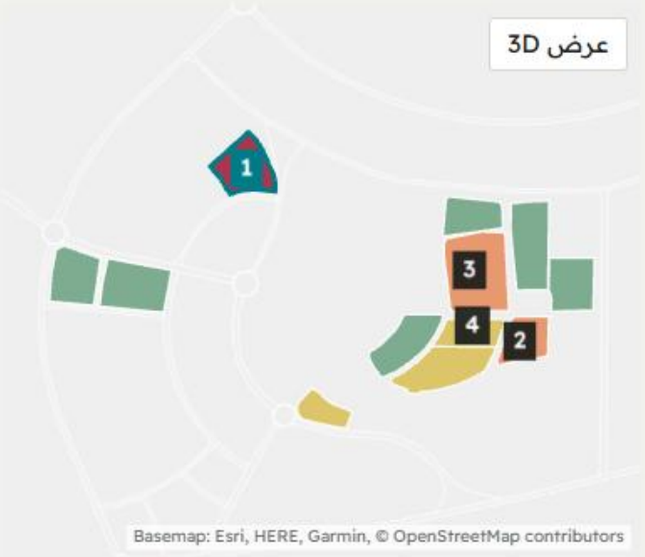

زيارة فورية · 1 زيارة الدورة دي · 2 مراجعة مستندات · 3

متابعة عادية · 6 مش قابل للتقييم · 0

عرض 3D بيرفع كل كمباوند بمتوسط ارتفاع مبانيه (Google Open Buildings، آخر سنة لحد 2024)، مكتر 10 مرات



2025-07-23 تحت الإنشاء

2022-06-13 تحت الإنشاء

2020-06-28 تحت الإنشاء

2016-12-17 أرض أو أعمال حفر

الصور من Esri World Imagery Wayback، وبيانات كل صورة مطبوعة تحتها.

حمّل قائمة الزيارات (CSV)

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير

الكمباوند

C18 · زيارة فورية

C18 • زيارة فورية

رصد نشاط بناء، تجاوز أول موعد تسليم معلن (ديسمبر 2021) بمقدار 57 شهرًا

بيانات 2026Q3 · مفيش زيارة متسجلة لسه



C18 اسحب على الصورة عشان تقارن بين تاريخين

اليمين 2025-07-23 · تحت الإنشاء

الشمال 2016-12-17 · أرض أو أعمال حفر

الشمال · 2016-12-17

Wayback release 2018-01-31 | Esri World Imagery Wayback; imagery: DigitalGlobe. Service credits: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA FSA, USGS, Aerogrid, IGN, IGP, and the GIS User Community
Cyan: reviewed working boundary, not a legal survey. Source dates may vary within the map.
Static educational report figure. Third-party imagery rights retained; not an open imagery dataset.

Wayback release 2026-09-24 | Esri World Imagery Wayback; imagery: Vantor. Service credits: Esri, Vantor, Earthstar Geographics, and the GIS User Community

ليه في الأولوية دي

K2 توقف النشاط
أرباع متتالية من غير نشاط بناء، بعد البداية
0 ربع

K3 عدّاد التسليم
أشهر من أول موعد تسليم معلن
57 شهرًا

K6 ما بدأش
أشهر من الإطلاق أو الوعد من غير بداية إنشاء
لا ينطبق: الإنشاء بدأ

الغرامة

K5 أشهر ممكن تتحسب عليها غرامة
العقد هو اللي بيحدد الغرامة
45 شهرًا

نشاط البناء كل ربع

درجة النشاط A — احتمال البناء Dynamic World

المطور نشر تصريح



Track A · screen 2 · part 1

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير



◂ القيم في جدول


مرحلة الإنشاء كل سنة




أرض أو أعمال حفر ■ تحت الإنشاء ■ مكتمل

أول إنشاء ظهر سنة 2020.

الشمال 2016-12-17 · أرض أو أعمال حفر



الشمال · 2016-12-17



اليمين · 2025-07-23

الصور من Esri World Imagery Wayback، وبيانات كل صورة مطبوعة تحتها.

المطور قال، والفضاء شاف

تصريحات المطور المنشورة، وجنب كل واحد أقرب صورة من الفضاء ومرحلة الإنشاء.

يوليو 2021 — **نسبة التنفيذ 65%**



2022-06-13 · تحت الإنشاء

سبتمبر 2021 — **نسبة التنفيذ أكتر من 70%**

سبتمبر 2021 — **وعد بالتسليم يونيو-يوليو 2023**

الموعد عدّى. الفضاء سنة 2023: تحت الإنشاء

سبتمبر 2021 — **وعد بتسليم المرحلة الأولى أكتوبر-ديسمبر 2021**

الموعد عدّى. الفضاء سنة 2021: تحت الإنشاء

مايو 2022 — **نسبة التنفيذ حوالي 75%**

نتيجة الزيارة

Track A · screen 2 · part 2



2022-06-13 · تحت الإنشاء

سبتمبر 2021 — **نسبة التنفيذ أكتر من 70%**

سبتمبر 2021 — **وعد بالتسليم يونيو-يوليو 2023**

الموعد عدّى. الفضاء سنة 2023: تحت الإنشاء

سبتمبر 2021 — **وعد بتسليم المرحلة الأولى أكتوبر-ديسمبر 2021**

الموعد عدّى. الفضاء سنة 2021: تحت الإنشاء

مايو 2022 — **نسبة التنفيذ حوالي 75%**

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير

نتيجة الزيارة

سجّل نتيجة الزيارة

نتيجة الزيارة الحقيقية بتتسجل هنا. ما تكتبش أسماء كمباوندات أو مطورين في الملاحظة.

الكود: C18

التاريخ: 02 / 11 / 2026

النتيجة: الشغل ماشي

ملاحظة: اختياري: اللي اتشاف في الموقع.

احفظ الزيارة

Track A · screen 2 · part 3

SpaceEye
مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات
المسار أ: صور الأقمار

الشاشات
1 · أولوية الزيارات
2 · ملف الكمباوند
3 · الفايدة
4 · لو عدد الزيارات اتغير

SpaceEye بيقدّم إيه للجنة

12 كمباوند في R7 · بيانات 2026Q3

بينبّه قبل ما الميعاد يعدّي

في 2020Q3، كان SpaceEye هينبّه على C21، قبل أول موعد تسليم له (ديسمبر 2023) بـ 39 شهرًا.

اللي اتشاف من الفضاء: لم يُرصد نشاط بناء منذ 6 أرباع، أول موعد تسليم معلن (ديسمبر 2023) لم يحن بعد، ولم تتأكد بداية إنشاء بعد 18 شهرًا من أول إطلاق أو وعد.

اللي حصل (اتنشر يناير 2026): جزء منه اتسلّم متأخر، والاستكمال اتأجل.



آخر صورة **2025-07-23**



بعد أول تنبيه **2021-04-09**

عليهم تنبيه دلوقتي، قبل ما أي موعد تسليم يعدّي

C07 ● **زيارة الدورة دي**
لم يرصد نشاط بناء منذ ربعين، لا يوجد موعد تسليم معلن متاح
افتح ملف C07

C03 ● **مراجعة مستندات**
لم يرصد نشاط بناء منذ 6 أرباع، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني
افتح ملف C03

المطور قال، والفضاء شاف

C18: المطور قال إن نسبة التنفيذ 65% في يوليو 2021، ثم أكتر من 70% في سبتمبر 2021، ثم حوالي 75% في مايو 2022.

- وعد بالتسليم يونيو-يوليو 2023 (اتنشر سبتمبر 2021). الفضاء سنة 2023: تحت الإنشاء.

توبر-ديسمبر 2021 (اتنشر سبتمبر
ت الإنشاء.





Track A · screen 3 · part 1

مايو 2022.

- وعد بالتسليم يونيو-يوليو 2023 (اتنشر سبتمبر 2021). الفضاء سنة 2023: تحت الإنشاء.
- وعد بتسليم المرحلة الأولى أكتوبر-ديسمبر 2021 (اتنشر سبتمبر 2021). الفضاء سنة 2021: تحت الإنشاء.

لحد ربع 2026Q3 عدّى 57 شهرًا على أول موعد تسليم معلن.

افتح ملف C18



2025-07-23

آخر صورة · تحت الإنشاء



2022-06-13

أقرب صورة لآخر تصريح · تحت الإنشاء


مطورين عندهم أكتر من كمباوند

اجتماع واحد مع المطور يغطي كل الكمباوندات بتاعته.

D14	C18 زيارة فورية	C01 متابعة عادية	
D13	C14 زيارة الدورة دي	C21 مراجعة مستندات	
D12	C12 مراجعة مستندات	C04 متابعة عادية	C10 متابعة عادية

106 أشهر تأخير ممكن تتحسب عليها غرامة

في 7 كمباوندات، محسوبة من مواعيد التسليم المنشورة. العقد هو اللي بيحدد الغرامة.

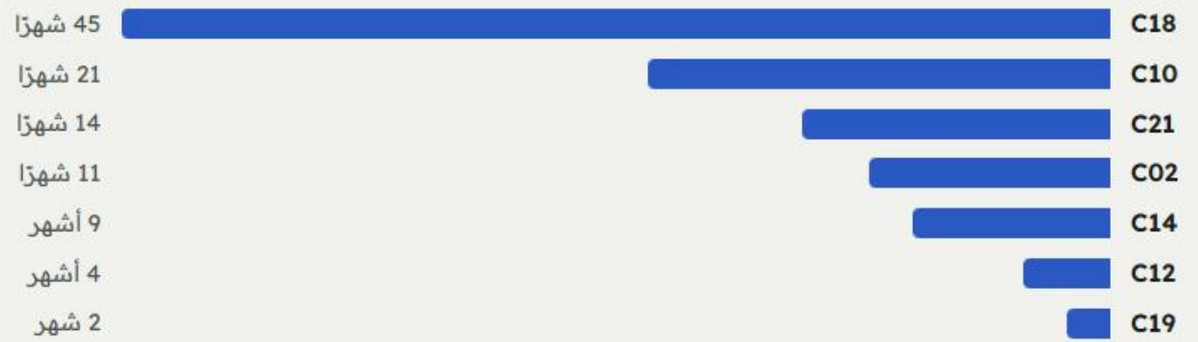

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير

Track A · screen 3 · part 2

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار أ: صور الأقمار

الشاشات

- 1 · أولوية الزيارات
- 2 · ملف الكمباوند
- 3 · الفايدة
- 4 · لو عدد الزيارات اتغير

- وعد بالتسليم يونيو–يوليو 2023 (اتنشر سبتمبر 2021). الفضاء سنة 2023: تحت الإنشاء.
- وعد بتسليم المرحلة الأولى أكتوبر–ديسمبر 2021 (اتنشر سبتمبر 2021). الفضاء سنة 2021: تحت الإنشاء.

لحد ربع 2026Q3 عدّى 57 شهرًا على أول موعد تسليم معلن.

افتح ملف C18



2025-07-23

آخر صورة · تحت الإنشاء



2022-06-13

أقرب صورة لآخر تصريح · تحت الإنشاء


مطورين عندهم أكتر من كمباوند

اجتماع واحد مع المطور يغطي كل الكمباوندات بتاعته.

D14	C18 زيارة فورية	C01 متابعة عادية	
D13	C14 زيارة الدورة دي	C21 مراجعة مستندات	
D12	C12 مراجعة مستندات	C04 متابعة عادية	C10 متابعة عادية

106 أشهر تأخير ممكن تتحسب عليها غرامة

في 7 كمباوندات، محسوبة من مواعيد التسليم المنشورة. العقد هو اللي بيحدد الغرامة.

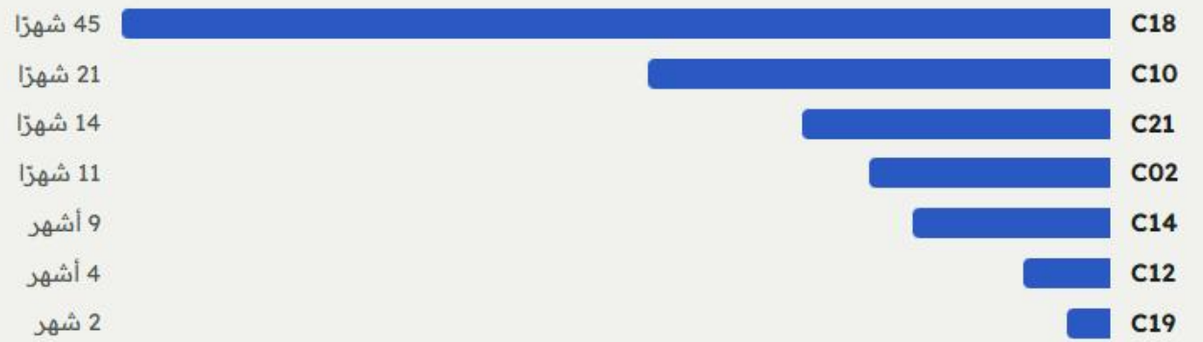

SpaceEye

مرصد R7 · العاصمة الإدارية الجديدة

مسار البيانات

المسار ب: صور وأرقام مولّدة

الشاشات

1 · أولوية الزيارات

2 · ملف الكمباوند

3 · الفايدة

4 · لو عدد الزيارات اتغير

بيانات مولّدة للتدريب

الخريطة مخفية في المسار ده

لو عدد الزيارات اتغير

مين يدخل القائمة ومين يطلع لو عندك زيارات أقل أو أكتر من 4.

لو عندك زيارتين بس

C03 يطلع من القائمة · المستوى 3

لم يرصد نشاط بناء منذ 6 أرباع، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني

C14 يطلع من القائمة · المستوى 2

رصد نشاط بناء، تجاوز أول موعد تسليم معلن (ديسمبر 2024) بمقدار 21 شهرًا

الربع 2026Q3

لو عندك 6 زيارات

C12 يدخل القائمة · المستوى 3

لم يرصد نشاط بناء منذ 6 أرباع، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني

C21 يدخل القائمة · المستوى 3

لم يرصد نشاط بناء منذ ربعين، يوجد إعلان تسليم منشور، قد يكون مكتملًا وفق إعلان التسليم أو الغطاء النباتي، يلزم تحقق ميداني

الربع 2026Q3
